



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCION – CUSCO

Creado por Ley N° 26521 – 09/08/1995

GERENCIA MUNICIPAL

“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”



Resolución Gerencial N° 112-2023-MDP/GM

Pichari, 14 de abril de 2023

VISTO:

La Opinión Legal N° 0189-2023-MDP-OAJ/JCHG del Director de la Oficina de Asesoría Jurídica, Informe N° 435-2023-MDP/ULP-EVN del Jefe Logística y Patrimonio, Informe N° 1008-2023-MDP-GI/DOP/EDARD del Responsable de la División de Obras Públicas, Carta N° 0111-2023-MDP-GI/JSCF-RO del Residente de obra, Carta N° 0014-2023-ACIM-GG, de petición de ampliación de plazo contractual a la Orden de Compra N° 3579-2022, derivado en el marco del procedimiento de selección por Adjudicación Simplificada N° 123-2022-MDP/OEC-1, solicitada por el contratista A&C INVERSIONES MÚLTIPLES S.R.L, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N° 30305, Ley de reforma de los artículos 191°, 194° y 203° de la Constitución Política del Perú, establece "Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. (...) lo que debe ser concordado con lo dispuesto por el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que prescribe "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.";

Que, en fecha 14 de diciembre del 2022, la Municipalidad Distrital de Pichari y el contratista A&C INVERSIONES MULTIPLES S.R.L con RUC N° 20494791235, representado por su Gerente Gilberto Allende Quispe, perfeccionaron la Orden de Compra N° 3579-2022, derivada en el marco del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 123-2022-MDP/OEC-1, para la adquisición de cemento portland tipo I para el Proyecto "Mejoramiento y ampliación del servicio de educación inicial de la I.E.I N° 387 del Centro Poblado de Ccatun Rumi del Distrito de Pichari", por un monto contractual de S/. 113,015.00 (Ciento Trece Mil Quince Con 00/100 Soles), con un plazo de entrega de sesenta (60) días calendario, computado a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra y cronograma;

Que, mediante Carta N°0014-2023-ACIM-GG presentada en fecha 22 de marzo de 2023, con registro N° 5111 de mesa de partes de la Entidad, el contratista A&C INVERSIONES MULTIPLES S.R.L con RUC N° 20494791235, representado por su Gerente Gilberto Allende Quispe, solicita ampliación de plazo a la orden de compra N° 3579-2022, sustentado por causas de atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista que impidieron el cumplimiento oportuno de las obligaciones de entrega de cemento portland tipo I para el señalado proyecto;

Que, mediante Informe N° 435-2023-MDP/ULP-EVN de fecha 11 de abril de 2023, el Jefe de la Unidad de Logística y Patrimonio Lic. Adm. Edgar Vega Neyra, previo análisis a la solicitud de ampliación de plazo con Reg. 5111 de mesa de partes, determina que es VIABLE aprobar la ampliación de plazo por 77 días calendario para la adquisición de cemento portland tipo I para el Proyecto "Mejoramiento y ampliación del servicio de educación inicial de la I.E.I N° 387 del Centro Poblado de Ccatun Rumi del Distrito de Pichari", recomendando su aprobación con acto resolutivo a través de la Gerencia Municipal;

Que, con Opinión Legal N° 189-2023-MDP/OAJ/JCHG de fecha 14 de abril de 2023, del Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica Abog. Jorge Chenett García, previo análisis factico y jurídico, concluye por DECLARAR aprobada de manera automática la ampliación de plazo de ejecución contractual solicitado por el contratista A & C INVERSIONES MÚLTIPLES S.R.L, por falta de pronunciamiento de la Entidad en el Plazo de 10 días hábiles según lo previsto en el numeral 158.3 del artículo 158° del RLCE y proseguir con la entrega de adquisición de cemento Portland tipo I, derivado de la Orden de Compra N°0003579, según el desagregado realizado en el informe N°435-2023-MDP/ULP-EVN por el Órgano encargado de Contrataciones de la Entidad, en beneficio del proyecto; "Mejoramiento y Ampliación del servicio de educación inicial de la I.E.I N°387 del Centro Poblado de Ccatun Rumi del distrito de Pichari, provincia La Convención, departamento Cusco". Y



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCIÓN – CUSCO

Creado por Ley N° 26521 – 09/08/1995

GERENCIA MUNICIPAL

“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”



RECOMIENDA; 1) Se genere el deslinde de responsabilidad para el deslinde de responsabilidad si lo hubiere, por parte de los servidores y/o funcionarios de la Municipalidad Distrital de Pichari. 2) Continuar con la prosecución del trámite como corresponda.

Que, el numeral 34.1 del artículo 34 del D.S. N° 082-2019-EF, Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que el contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y en el Reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de forma oportuna y eficiente; concordante a dicho extremo, el numeral 34.9 de la misma norma señala que el contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento, siendo éste el supuesto materia de atención;

Que, respecto el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, respecto al procedimiento de ampliación de plazo contractual establece lo siguiente:


158.2 “Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, la contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado; b) Por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista”.

158.3 “El contratista solicita la ampliación del plazo dentro de los siete (07) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización.”

158.4 “La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al contratista en el Plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del titular de la Entidad”.

Que, se ha verificado según el registro de expediente administrativo N°5111-2023 de fecha 22 de marzo de 2023, dicho expediente de solicitud de ampliación de plazo quedó sin atención del dentro del plazo legal atendándose extemporáneamente mediante el Informe N°435-2023-MDP/ULP-EVN del Jefe de la Unidad de Logística y Patrimonio, con registro posterior al vencimiento del plazo establecido por norma, generándose el consentimiento y la aprobación automática. En consecuencia, este hecho conlleva responsabilidad administrativa, debiendo de remitirse los actuados al Unidad de Recursos Humanos de la Entidad como consecuencia de haberse cometido una presunta negligencia en el trámite de ampliación de plazo contractual, dejando transcurrir el plazo de 10 días hábiles sin emitir pronunciamiento alguno, dejando que se apruebe el plazo solicitado de manera automática;

Que, cabe señalar que el proveedor no ha consignado en su solicitud la cantidad de días de ampliación, por lo que; se tomara en consideración el desagregado realizado por el Órgano encargado de Contrataciones de la MDP en su informe N° 435-2023-MDP/ULP-EVN de fecha 12 abril del 2023, con el que aprueba la solicitud de ampliación de plazo por 77 días calendario.

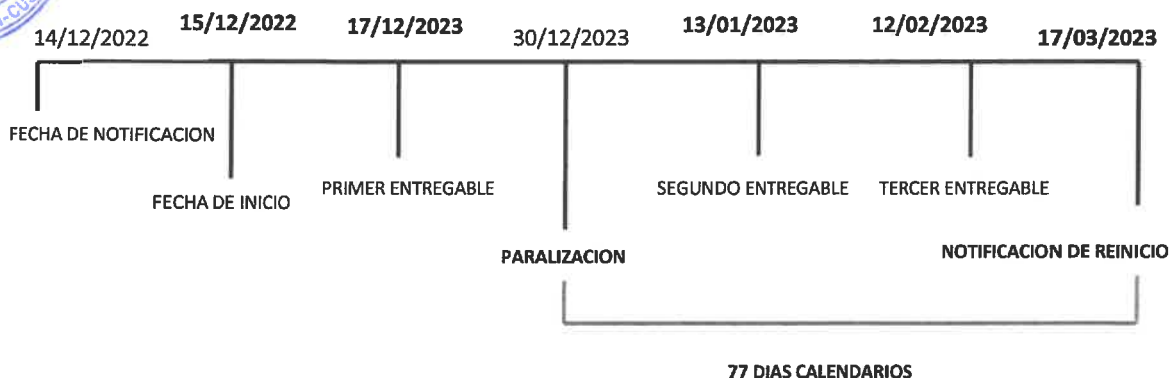

Que, a mérito de la facultad delegada a la Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Pichari según literal i) del numeral I), correspondiente al artículo primero de la Resolución de Alcaldía N° 011-2023-A-



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCION – CUSCO
Creado por Ley N° 26521 – 09/08/1995

GERENCIA MUNICIPAL

“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”




MDP/LC, la Gerencia Municipal asume competencia para la expedición del acto resolutorio para resolver solicitudes de ampliación de plazo contractual provenientes de los procedimientos de selección, (...);

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, Decreto Supremo N° 082-2019-EF, TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; y con las facultades delegadas a la Gerencia Municipal con la Resolución de Alcaldía N°011-2023-A-MDP/LC, y la designación con Resolución de Alcaldía N°001-2023-A-MDP/LC y demás normas legales vigentes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR la APROBACION AUTOMATICA de la petición de AMPLIACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL solicitada por el contratista A&C INVERSIONES MULTIPLES S.R.L con RUC N° 20494791235, representado por su Gerente Gilberto Allende Quispe, por SETENTA Y SIETE (77) DÍAS CALENDARIO, aplicable al Orden de Compra N° 3579-2022, derivada en el marco del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 123-2022-MDP/OEC-1, para la adquisición de cemento portland tipo I para el Proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio de educación inicial de la I.E.I N° 387 del Centro Poblado de Ccatun Rumi del Distrito de Pichari”, al no haberse dado respuesta dentro del plazo establecido en el numeral 158.3 del artículo 158 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debiendo reprogramarse el plazo y cronograma en atención al informe Informe N° 435-2023-MDP/ULP-EVN de fecha 11 de abril de 2023 emitido por el Jefe de la Unidad de Logística y Patrimonio, conforme al siguiente detalle;

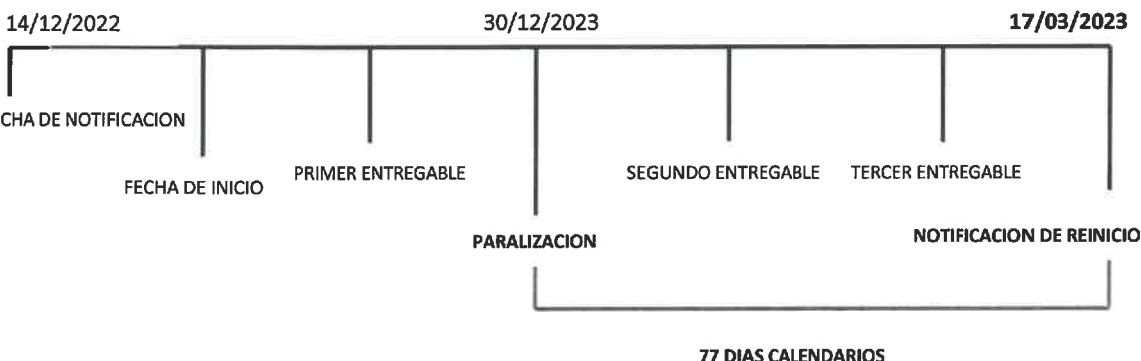

ARTÍCULO SEGUNDO. – DISPONER a la Unidad de Logística y Patrimonio la implementación de acciones administrativas y notificación del presente acto resolutorio al contratista, en observancia del procedimiento establecido en la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR, la presente resolución a las instancias administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari.

ARTÍCULO CUARTO. – ENCARGAR a la Oficina de Administración y Finanzas, remitir copia de los actuados a la Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios, implementar el Procedimiento Administrativo Disciplinario, para la determinación de las responsabilidades a que hubiere lugar por la inobservancia del plazo de respuesta a la solicitud de ampliación de plazo, conforme a lo establecido en el numeral 158.3 del artículo 158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c.
ALCALDIA
S.I
O.A.F
U.LyP
U.RR.HH
Pag. Web
Archivo



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION – CUSCO

C.P.C. Nelson Ayvar Gutierrez
GERENTE MUNICIPAL
